

白川ポンプ場建設工事通信誌 No.11

令和元年9月12日発行

現在、コンクリート打設や河川内の矢板打設などにおける機械の騒音や振動、並びに大型車両の通行で近隣のみなさまには大変ご迷惑をおかけしております。安全第一で工事を進めていきますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


トピック1 ポンプ場本体地下部の柱や壁を施工しています。

- 底版部の施工が完了し、現在、柱や壁の鉄筋・型枠工事を行っています。

地下部鉄筋型枠状況（9月6日）



コンクリート打設時期、作業時間

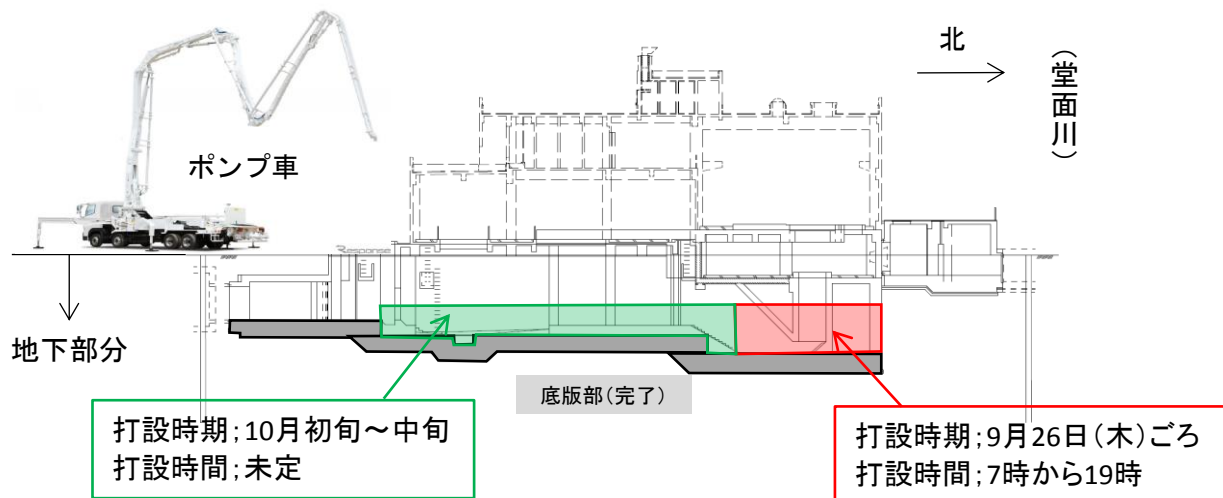

※早朝からの作業を予定しています。正式な日時は、その都度予告看板を現地に設置します。

※大型車両（生コン車）が頻繁に通行するため、堤防道路の渋滞が予想されます。円滑な交通誘導に努めますが、お急ぎの方は迂回等のご協力をお願いします。

お知らせ

現在、作業の終了時間を18:00 から 20:00 まで延長し、進捗によっては日曜日も作業をさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

※ 延長した2時間や日曜作業は騒音・振動の小さな作業です。

※ 道路の交通規制を伴う作業の時間はこれまで同様9:00～17:00です。

(裏面へ)

トピック2 放流きょ工事の矢板を設置しました。

- 放流きょ（ポンプ場から堂面川へ接続する部分）工事の準備として、作業ヤードを整備し、河川内に鋼矢板の一部を設置しました。今後、12月より放流きょ工事に本格着手します。

う回道路運用状況と鋼矢板設置状況（9月6日）



※う回道路は安全通行確保のため、大型車及び中型車の通行は基本不可とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。



通信誌作成者：三井住友・西日本メンテナンス・瀬口・クボタ・東芝JV

(工事問合せ先) 白川ポンプ場作業所 (代表企業:三井住友建設株式会社 九州支店) (TEL 0944-88-8215)
大牟田市企業局 白川ポンプ場建設推進室 (TEL 0944-41-2850)
