

# 白川ポンプ場建設工事通信誌 No.6

平成30年10月12日発行

通信誌作成者：三井住友・西日本メンテナンス・瀬口・クボタ・東芝JV

工事中は、建設機械の騒音や振動などで、近隣の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、最大限配慮して施工してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


## トピック1 ポンプ場本体(地下部分)の構築を開始します。

- 現在、ポンプ場本体の地下部分を構築するための掘削・山留工事を行っています。

### 連続地中壁内の掘削状況（撮影 10月1日）




- 上記掘削・山留工事が完了した後、11月から地下部分(地下2階)のコンクリート構造物を作っていきます。引き続き安全第一で作業を進めてまいります。

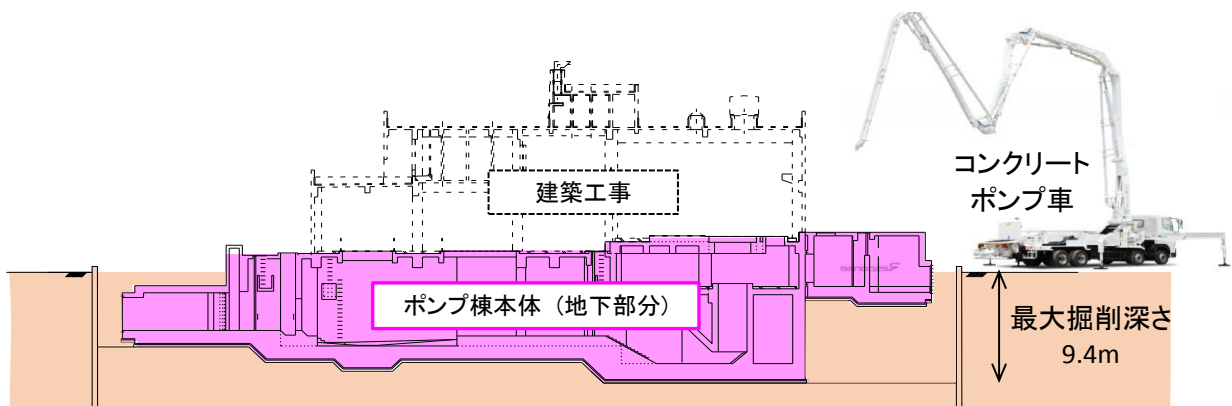

計画では、構造物を11に区分し、主に、型枠→鉄筋→コンクリート打設→養生を繰り返します。

作業中は騒音や振動などが発生する場合があります。また、県道から堂面川沿いを大型車両(生コン車)が頻繁に通行いたします。

ご迷惑をおかけしますが、引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。



## 今後の予定

ポンプ場本体(地下部分)の施工は平成30年11月から平成31年12月までの予定です。

(工事問合せ先) 白川ポンプ場作業所(代表企業:三井住友建設株式会社 九州支店) (TEL 0944-88-8215)  
大牟田市企業局 白川ポンプ場建設推進室 (TEL 0944-41-2850)
