

三川ポンプ場建設 便り

～第9号（令和7年9月）～




1. 建築工事の進捗状況

6月末に3階躯体、7月末に階段室躯体及び排煙室躯体のコンクリート打設を行いました。

6月末の作業では、大規模なコンクリート打設（約620 m^3 ）となりましたが、地域の皆様のご理解とご協力のお陰で無事、打設を終えることができました。

今後は、外壁塗装や内部仕上等の工事を行っていきます。

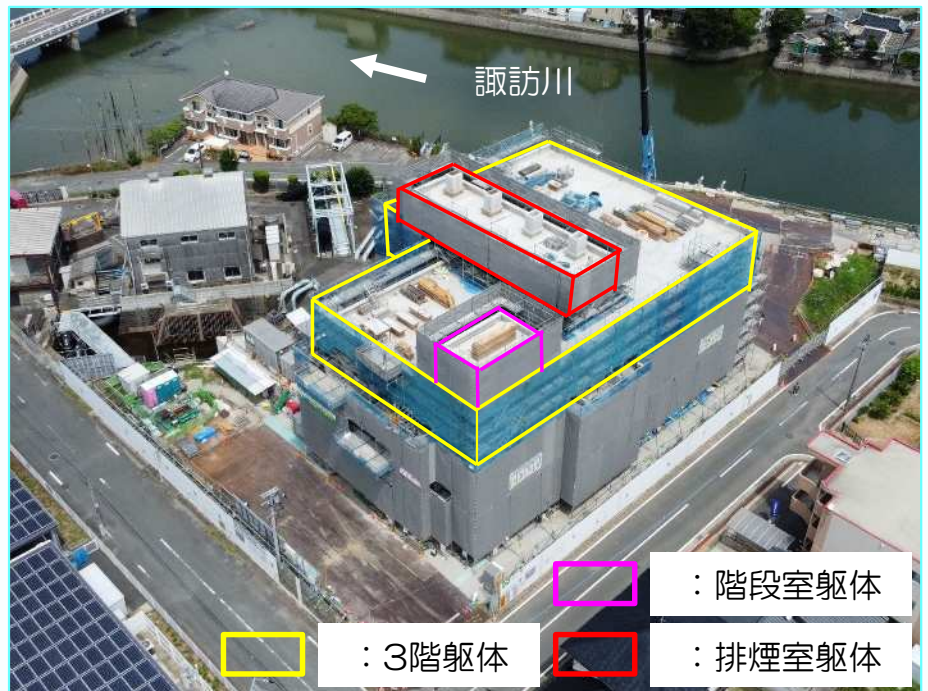

2. 機械・電気工事の進捗状況

雨水ポンプ（口径1500mm）が3台完成しました。

3台で排出できる雨水の量は、1分間に825 m^3 （既設三川ポンプ場645 m^3 ）です。

例えば、一度に3台運転した場合、みなと小学校の25mプール（約350 m^3 ）を約25秒で空にすることができます。

今後は、完成した雨水ポンプの据付作業を行っていきます。



【整備スケジュール】

- | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| ・土木（ 完工 ）
（令和4年度～6年度） | ・機械、電気
（令和5年度～8年度） | ・建築
（令和6年度～7年度） | ・試運転
（令和8年度） | ・場内整備
（令和8年度） |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|

【発行】

大牟田市 企業局下水道課・施設課
TEL:0944-41-2844 FAX:0944-41-2842
Email:e-gesuidou01@city.omuta.fukuoka.jp

日本下水道事業団九州総合事務所
TEL:093-583-8936

（建築工事）
戸田・大平建工特定建設共同企業体
TEL:0944-32-8501

（機械工事）
株式会社 石垣
TEL:092-471-1411

（電気工事）
東芝プラントシステム株式会社
TEL:092-735-3539
