



三川ポンプ場建設 便り

～第5号（令和5年10月）～



大牟田市

1. ①ポンプ棟の掘削工事と②放流水路（ポンプ棟側）の施工を進めています

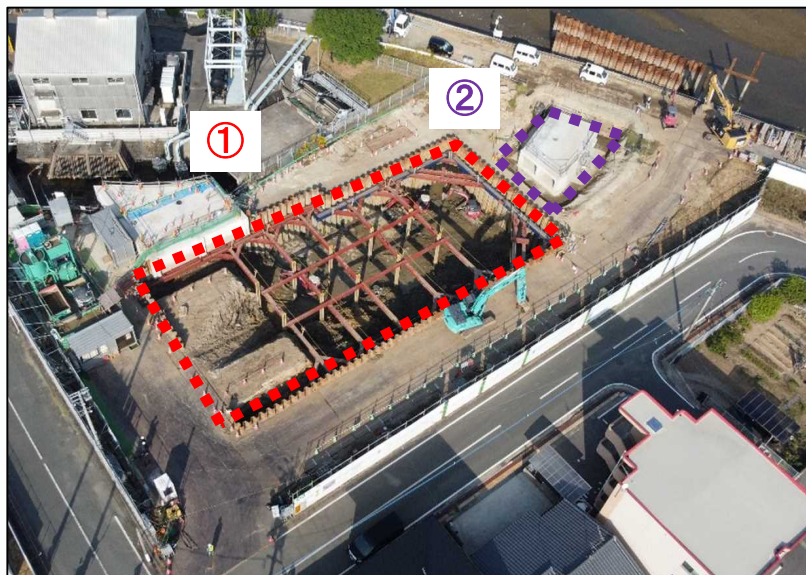

①ポンプ棟の掘削工事

9月：地山の崩壊等を防ぐため、鋼矢板（長さ約12m）の圧入作業が完了

10月：ポンプ棟の掘削工事に本格的に着手

11月：掘削完了予定

②放流水路（ポンプ棟側）の施工

9月：掘削、基礎杭打設が完了

10月：躯体コンクリートの打設が完了

11月：河川側の施工に着手予定

2. 作業状況

（①ポンプ棟の掘削状況）



現地盤から約7m下まで掘り下げます。掘削発生土を場外に運搬するためのダンプトラックが日中（頻繁に）現場を出入りしておりますが、安全第一で施工して参ります。

（②放流水路の施工状況）



放流水路とは、ポンプ場に流入してきた雨水をポンプで吸い上げた後に、諏訪川へ放流するための水路で幅2.5m×高さ1.4mのボックスカルバートを2列並べる構造となります。

【整備スケジュール】

- ・土木（令和4年度～6年度）
- ・機械、電気（令和5年度～8年度）
- ・建築（令和6年度～7年度）
- ・試運転（令和8年度）
- ・場内整備（令和8年度）

【発行】

大牟田市 企業局下水道課・施設課
TEL:0944-41-2844 FAX:0944-41-2842
Email:e-gesuidou01@city.omuta.fukuoka.jp

日本下水道事業団九州総合事務所
TEL:093-583-8936

戸田・大平建工特定建設共同企業体
TEL:0944-32-8501
