

# 白川ポンプ場建設工事通信誌 No.7

平成31年2月9日発行


通信誌作成者：三井住友・西日本メンテナンス・瀬口・クボタ・東芝JV

工事中は、建設機械の騒音や振動などで、近隣のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、最大限配慮して施工してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


## ポンプ場本体基礎部の施工を開始します。

- 現在、ポンプ場本体基礎部付近の湧水対策工事を行っており、この工事が完了後、最終の掘削を行って本体基礎地盤の仕上げを行います。

### ポンプ場内の状況（撮影 1月23日）

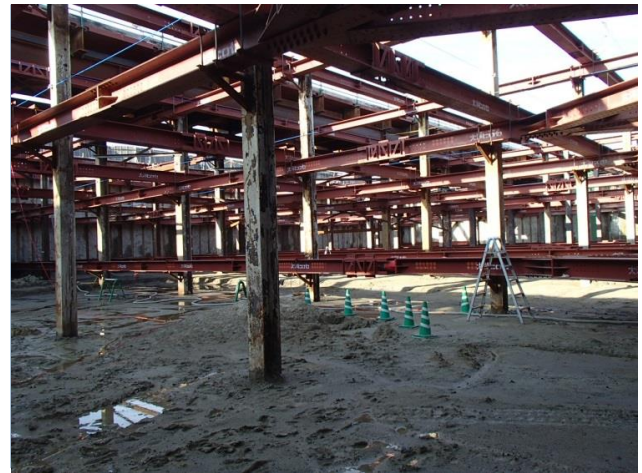

- ポンプ場本体基礎地盤の仕上げが完了した後、3月から本体基礎部分のコンクリート構造物を下図の①→②→③の順番で構築していきます。

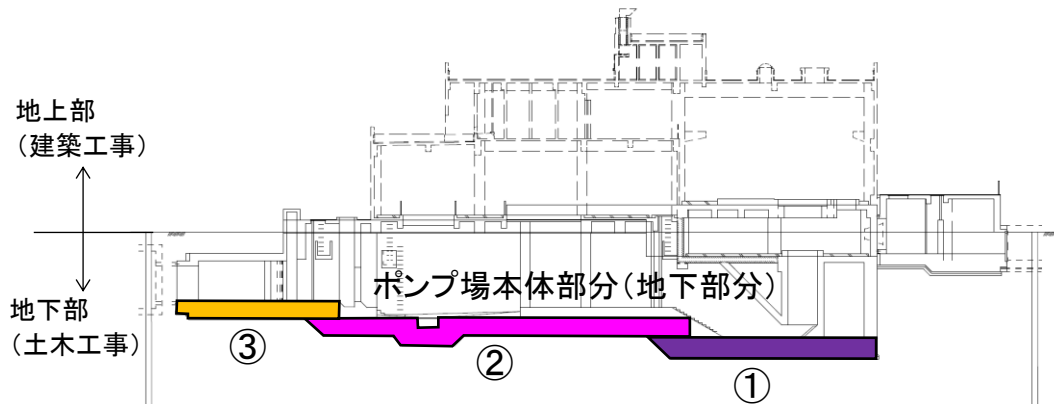

- ・主に型枠組立→鉄筋組立→コンクリート打設→養生→型枠解体の順番で行います。
- ・基礎部コンクリート打設日数は①～③各1日の予定です。
- ・打設中はポンプ車の騒音や振動などが発生します。また、県道から堂面川沿いを大型車両（生コン車）が頻繁に通行します。打設の時期が決まりましたら、現地には予告看板を設置します。
- ・ご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、引き続きご協力をお願いいたします。

**今後の予定** ポンプ場本体部分（地下部分）の壁や柱等のコンクリート構造物施工は平成31年4月から開始予定です。

（工事問合せ先） 白川ポンプ場作業所（代表企業：三井住友建設株式会社 九州支店）（TEL 0944-88-8215）  
大牟田市企業局 白川ポンプ場建設推進室（TEL 0944-41-2850）
